


3 週 間 工 程 表

2024年 9月 12日(木)

監理技術者	現場代理人	作成	NO.
室井	橋本	橋本	1
2024/9/12	2024/9/12	2024/9/12	

請負者名 明正工業株式会社

実施工程表		2024年 9月 12日(木)																						施工報告			
		先週								今週								来週						※報告は一工程終了毎とする (確認内容も含めて記載する)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
工事区分	区 分	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
	曜 日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
材料搬入																											
仮配管布設工																											
給水切替工																											
準備工																											
本管布設工																											
舗装版切断																											
月間現場目標		交通ルールの遵守																									
現場重点目標		交通災害防止								重機災害防止								作業区画の設定									
記 事		監 督 員 立 会																監 督 員 立 会									
(検査項目等記載)																											

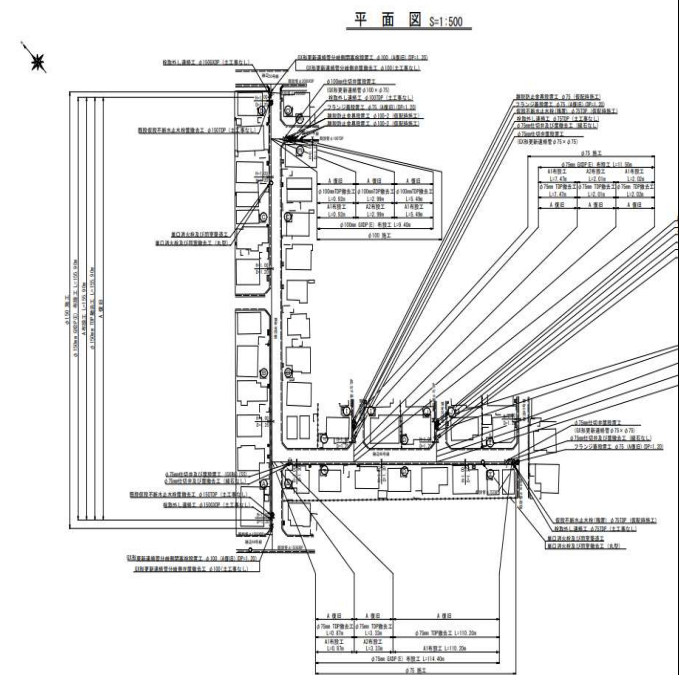

← 赤実績 ← 黒施工予定
