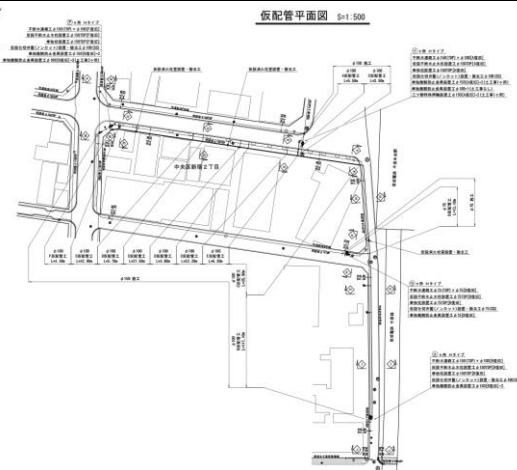


# 3 週 間 工 程 表

| 実施工程表       |     | 2023年 7月 6日(木)           |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | 監理技術者 現場代理人 |    | 作成       | NO.      |  |                                 |  |  |  |  |
|-------------|-----|--------------------------|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|----|-------------|----|----------|----------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
|             |     | 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事   |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | 高橋          | 岩井 | 岩井       | 1        |  |                                 |  |  |  |  |
|             |     | 請負者名 明正工業株式会社            |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | 2023.7.6    |    | 2023.7.6 | 2023.7.6 |  |                                 |  |  |  |  |
| 工事区分        | 区 分 | 先週                       |    |    |    |    | 今週      |   |   |   |   | 来週    |   |   |   |    |    | 施 工 報 告     |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
|             | 月/日 | 26                       | 27 | 28 | 29 | 30 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12          | 13 | 14       | 15       | 16   | ※報告は一工程終了毎とする<br>(確認内容も含めて記載する) |  |  |  |  |
|             |     | 曜 日                      | 月  | 火  | 水  | 木  | 金       | 土 | 日 | 月 | 火 | 水     | 木 | 金 | 土 | 日  | 月  | 火           | 水  | 木        | 金        | 土  | 日                               |  |  |  |  |
| <b>準備工</b>  |     |                          |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  <p>●7/24週にて離脱防止・仮配管の資材搬入に伴い材料立会検査お願い致します。</p> <p>●協議進捗・東京ガス…調整中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・NTT…7/3協議開始</li> <li>・東京電力…7/6協議開始</li> <li>・千葉市…7/11協議予定</li> </ul> <p>●工事説明書配布及び説明の日程関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス会社…7/11より順次<br/>(ちばシティ、館山日東、京成バス、京浜急行、九十九里、小湊、成田空港交通、千葉海浜交通、千葉交通、千葉中央バス、東京空港交通、日東交通)</li> </ul> |                                 |  |  |  |  |
| 着手書類作成      |     | [Gantt Chart: 7/6-7/16]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 墨出し         |     | [Gantt Chart: 7/6-7/16]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 置場設営        |     | [Gantt Chart: 7/6-7/16]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 工事看板設置      |     | [Gantt Chart: 7/6-7/16]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 舗装切断工       |     | [Gantt Chart: 7/18-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 試掘工         |     | [Gantt Chart: 7/19-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 資材搬入        |     | [Gantt Chart: 7/24-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| <b>仮配管工</b> |     |                          |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| アヶ所不断水連絡工   |     | [Gantt Chart: 7/31-8/3]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| イヶ所不断水連絡工   |     | [Gantt Chart: 7/31-8/3]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| ウヶ所不断水連絡工   |     | [Gantt Chart: 7/31-8/3]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| エヶ所不断水連絡工   |     | [Gantt Chart: 7/31-8/3]  |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 離脱防止金具取付    |     | [Gantt Chart: 7/31-7/31] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| φ100仮配管     |     | [Gantt Chart: 7/24-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| φ75仮配管      |     | [Gantt Chart: 7/24-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 充水・洗浄       |     | [Gantt Chart: 7/24-7/24] |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 月間現場目標      |     | 転落・転倒災害防止                |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 現場重点目標      |     | 体調確認                     |    |    |    |    | 第三者災害防止 |   |   |   |   | 熱中所対策 |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| 記 事         |     |                          |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
| (検査項目等記載)   |     |                          |    |    |    |    |         |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |             |    |          |          |  |                                 |  |  |  |  |
