3　週　間　工　程　表

実施工程表	2023年 8月　3日(木) 千葉市中央区新宿2丁目7番地先配水管整備工事 請負者名　明正工業株式会社	監理技術者	現場代理人	作成	NO.
		高橋 2023.8.3	岩井 2023.8.3	岩井 2023.8.3	5

工事区分	区分	先週							今週							来週						
	月／日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	曜　日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工																						
着手書類作成																						
墨出し																						
置場設営																					夏	
工事看板設置																					季	
舗装切断工										イヶ所不断水止水・工箇所離脱防止箇所											休	
試掘工						アヶ所箇所															暇	
仮配管講習会			★																			
資材搬入			●			● 土木資材・弁筐等																
仮配管工	仮配管・離脱防止等搬入																					
アヶ所不断水連絡工	7/31～8/3不断水連絡.不断水止水設置																					
イヶ所不断水連絡工												不断水止水未設置									
ウヶ所不断水連絡工																						
エヶ所不断水連絡工											不断水止水未設置											
離脱防止金具取付	7/31～離脱防止金具取付															エヵ所	アヶ所					
φ100仮配管																						
φ75仮配管																						
充水・洗浄																						
月間現場目標	転落・転倒災害防止																					
現場重点目標		交通災害防止							第三者災害							熱中所対策						
記事 (検査項目等記載)			立会検査			立会検査			他業者立会	他業者立会	他業者立会	他業者立会										

施　工　報　告

※報告は一工程終了毎とする
（確認内容も含めて記載する）

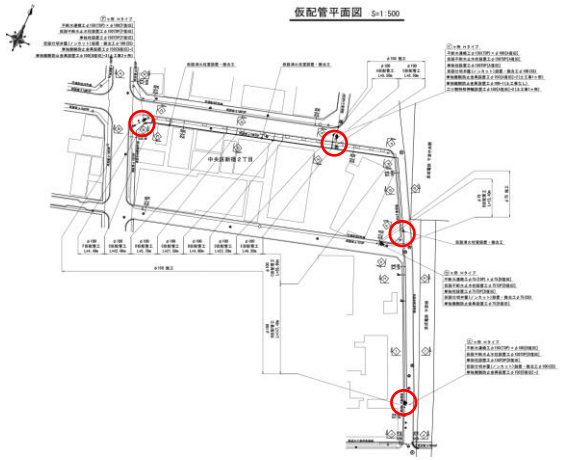

●イヶ所とエヶ所での不断水止水未設置
エヵ所は打合せ簿にて協議依頼中

8月21日　24日施工予定
